

АКТ
контрольного мероприятия

13.07.2021

Составлен в соответствии с Порядком осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.01.2018 № 5-п, в отношении имущества, предоставленного в концессию.

Дата, время и место составления: 13.07.2021 в 09⁰⁰ – 10³⁰ часов, кабинет 208 здания Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, расположенного по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15.

Объект контроля: полигон твердых бытовых отходов г. Зеленогорска (далее – полигон ТБО), расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Лебедевская, 9 (далее – Имущество), в отношении которого заключено концессионное соглашение на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске от 21 декабря 2015 (далее – Соглашение), между Муниципальным образованием город Зеленогорск Красноярского края от имени которого выступает Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальным унитарным предприятием «Комбинат благоустройства» г. Зеленогорска (далее – Концедент) и Простым товариществом, состоящим из ООО «Экоресурс», ООО «Вторичные ресурсы Красноярск», ООО «ЭКОСТРОЙ-ИНВЕСТ» (далее – Концессионер).

Орган, осуществляющий контроль: в соответствии с пунктом 78 Соглашения контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществляет Концедент.

В состав комиссии вошли:

Шмигидина М.Г.	руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Артемьев С.В.	директор МБУ КБУ
Шмелев А.Б.	начальник ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Вишнякова И.Е.	начальник земельного отдела КУМИ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

При участии представителей Концессионера Маковоза А.Н. и Полещук Е.А.

Вид контрольного мероприятия: внеплановая проверка в связи с направлением претензии Концессионеру 09.06.2021.

Дата начала проведения контрольного мероприятия: 12.07.2021 15 часов 00 минут.


Дата окончания проведения контрольного мероприятия: 12.07.2021 17 часов 00 минут.

Действия, осуществленные в рамках контрольного мероприятия: внеплановая проверка исполнения обязанностей Концессионера по строительству III очереди.

Сведения о результатах контрольного мероприятия.

Согласно пункту 16 Соглашения, Концессионер обязан выполнить за свой счет инженерные изыскания и получить положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, подготовить проектную документацию на создание и реконструкцию полигона ТБО, получить положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации и государственной экспертизы проектной документации; указанные документы согласовать с Концедентом до 31.12.2017; согласно пункту 21 – обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения (III очередь полигона ТБО) в срок до 31.12.2020.

Комиссией установлено следующее.

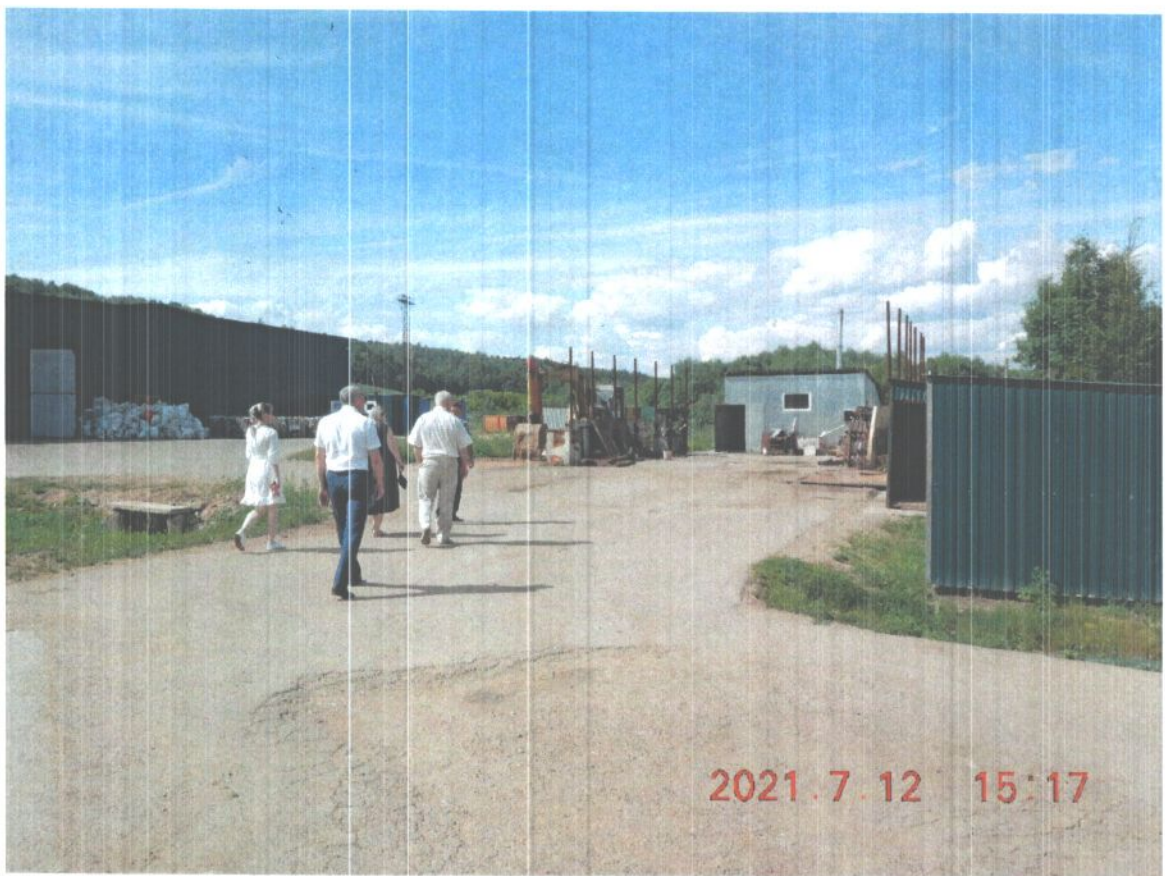














2021.7.12 15:35

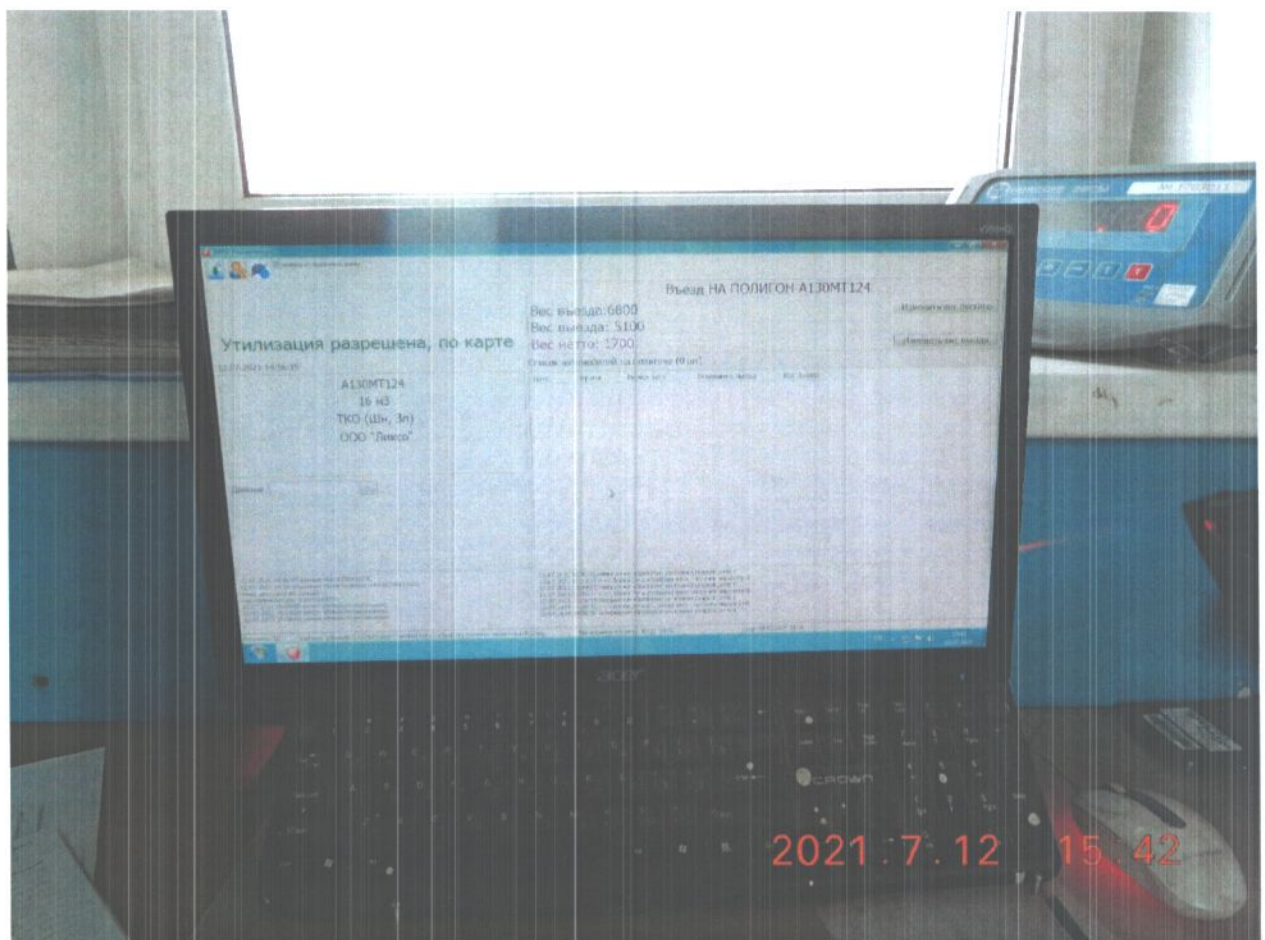

2021.7.12 15:42



Наименование для сметы по строкам	Материалы по строкам по строкам по строкам	Единица измерения	Количество по строкам по строкам по строкам	Стоимость по строкам по строкам по строкам
С 5.07 по 11.07.21				
ооо 1.0.0.0.0.0	3054	м	350280	
243	181	м	85000	
254	10	м	53000	
Средства 1.0.0.0.0.0	10	м	18000	
ооо 2.0.0.0.0.0	2	м	4000	
2.0.0.0.0.0	30	м	17000	
2.0.0.0.0.0	10	м	5000	
Материалы 1.0.0.0.0.0	45	м	26700	
2.0.0.0.0.0	10	м	4500	
ооо 3.0.0.0.0.0	2	м	3000	
Средства 1.0.0.0.0.0	15	м	1000	
Средства 1.0.0.0.0.0	10	м	1500	
Итого			3406	449880

Наименование для сметы по строкам	Материалы по строкам по строкам по строкам	Единица измерения	Количество по строкам по строкам по строкам	Стоимость по строкам по строкам по строкам
1.0.0.0.0.0	10	м	1000	
2.0.0.0.0.0	10	м	1000	
3.0.0.0.0.0	10	м	1000	
4.0.0.0.0.0	10	м	1000	
5.0.0.0.0.0	10	м	1000	
6.0.0.0.0.0	10	м	1000	
7.0.0.0.0.0	10	м	1000	
8.0.0.0.0.0	10	м	1000	
9.0.0.0.0.0	10	м	1000	
10.0.0.0.0.0	10	м	1000	
11.0.0.0.0.0	10	м	1000	
12.0.0.0.0.0	10	м	1000	
13.0.0.0.0.0	10	м	1000	
14.0.0.0.0.0	10	м	1000	
15.0.0.0.0.0	10	м	1000	
16.0.0.0.0.0	10	м	1000	
17.0.0.0.0.0	10	м	1000	
18.0.0.0.0.0	10	м	1000	
19.0.0.0.0.0	10	м	1000	
20.0.0.0.0.0	10	м	1000	
21.0.0.0.0.0	10	м	1000	
22.0.0.0.0.0	10	м	1000	
23.0.0.0.0.0	10	м	1000	
24.0.0.0.0.0	10	м	1000	
25.0.0.0.0.0	10	м	1000	
26.0.0.0.0.0	10	м	1000	
27.0.0.0.0.0	10	м	1000	
28.0.0.0.0.0	10	м	1000	
29.0.0.0.0.0	10	м	1000	
30.0.0.0.0.0	10	м	1000	
31.0.0.0.0.0	10	м	1000	
32.0.0.0.0.0	10	м	1000	
33.0.0.0.0.0	10	м	1000	
34.0.0.0.0.0	10	м	1000	
35.0.0.0.0.0	10	м	1000	
36.0.0.0.0.0	10	м	1000	
37.0.0.0.0.0	10	м	1000	
38.0.0.0.0.0	10	м	1000	
39.0.0.0.0.0	10	м	1000	
40.0.0.0.0.0	10	м	1000	
41.0.0.0.0.0	10	м	1000	
42.0.0.0.0.0	10	м	1000	
43.0.0.0.0.0	10	м	1000	
44.0.0.0.0.0	10	м	1000	
45.0.0.0.0.0	10	м	1000	
46.0.0.0.0.0	10	м	1000	
47.0.0.0.0.0	10	м	1000	
48.0.0.0.0.0	10	м	1000	
49.0.0.0.0.0	10	м	1000	
50.0.0.0.0.0	10	м	1000	
51.0.0.0.0.0	10	м	1000	
52.0.0.0.0.0	10	м	1000	
53.0.0.0.0.0	10	м	1000	
54.0.0.0.0.0	10	м	1000	
55.0.0.0.0.0	10	м	1000	
56.0.0.0.0.0	10	м	1000	
57.0.0.0.0.0	10	м	1000	
58.0.0.0.0.0	10	м	1000	
59.0.0.0.0.0	10	м	1000	
60.0.0.0.0.0	10	м	1000	
61.0.0.0.0.0	10	м	1000	
62.0.0.0.0.0	10	м	1000	
63.0.0.0.0.0	10	м	1000	
64.0.0.0.0.0	10	м	1000	
65.0.0.0.0.0	10	м	1000	
66.0.0.0.0.0	10	м	1000	
67.0.0.0.0.0	10	м	1000	
68.0.0.0.0.0	10	м	1000	
69.0.0.0.0.0	10	м	1000	
70.0.0.0.0.0	10	м	1000	
71.0.0.0.0.0	10	м	1000	
72.0.0.0.0.0	10	м	1000	
73.0.0.0.0.0	10	м	1000	
74.0.0.0.0.0	10	м	1000	
75.0.0.0.0.0	10	м	1000	
76.0.0.0.0.0	10	м	1000	
77.0.0.0.0.0	10	м	1000	
78.0.0.0.0.0	10	м	1000	
79.0.0.0.0.0	10	м	1000	
80.0.0.0.0.0	10	м	1000	
81.0.0.0.0.0	10	м	1000	
82.0.0.0.0.0	10	м	1000	
83.0.0.0.0.0	10	м	1000	
84.0.0.0.0.0	10	м	1000	
85.0.0.0.0.0	10	м	1000	
86.0.0.0.0.0	10	м	1000	
87.0.0.0.0.0	10	м	1000	
88.0.0.0.0.0	10	м	1000	
89.0.0.0.0.0	10	м	1000	
90.0.0.0.0.0	10	м	1000	
91.0.0.0.0.0	10	м	1000	
92.0.0.0.0.0	10	м	1000	
93.0.0.0.0.0	10	м	1000	
94.0.0.0.0.0	10	м	1000	
95.0.0.0.0.0	10	м	1000	
96.0.0.0.0.0	10	м	1000	
97.0.0.0.0.0	10	м	1000	
98.0.0.0.0.0	10	м	1000	
99.0.0.0.0.0	10	м	1000	
100.0.0.0.0.0	10	м	1000	



2021.7.12 15:43
